Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

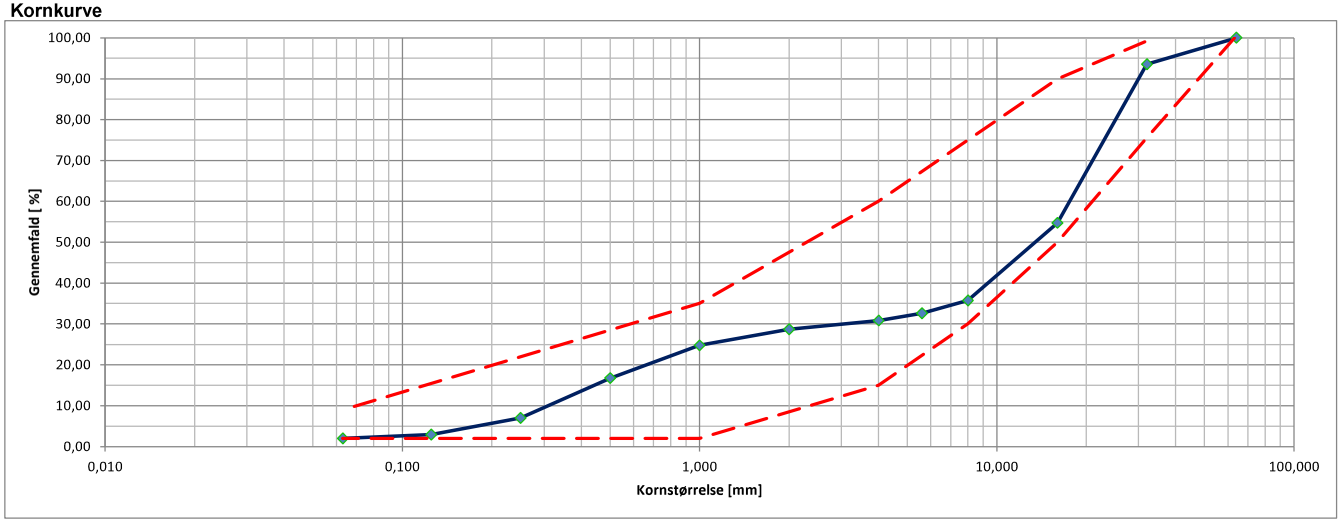

Grænsekurver indtegnet for SG II, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
64	100		
32	94		
16	55		
8	36		
5,6	33		
4	31		
2	29		
1	25		
0,5	17		
0,25	7		
0,125	3		
0,063	2,0		

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte mm	Opnået	Min.	Max.
8 - 16 mm	19	*5*	*35*
4 - 8 mm	5	*5*	*35*

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	57		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå	< 3	*< 3*	DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	7,4		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

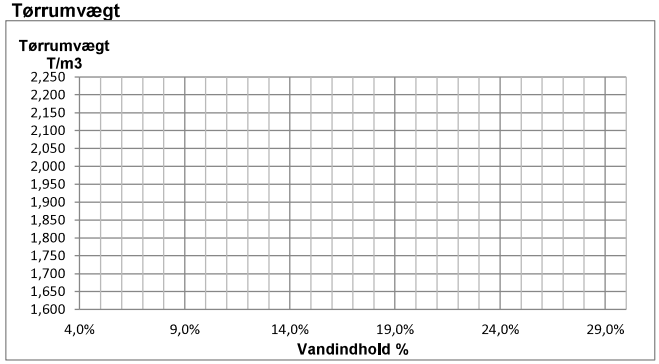

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Sinding Grusgrav**	
rekvirent	Sinding Grusgrav	
location	Depot	
materiale	SG II	Visgaard & Sundstrøm Vej- og Geoteknik
udtaget den	5. januar 2026	
udført ini.	BVH	
kontrol ini.	MMS	
Sag nr.	18.016	
Prøve nr.	SS006	
